BÀI 2: NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mục tiêu:

Sinh viên phân tích được mục tiêu và nội dung quản lý dự án, hiểu và vận dụng được công cụ, phương pháp quản lý dự án nhằm đạt được những mục tiêu trong phạm vi giới hạn về thời gian và ngân sách, phân biệt các mô hình hình quản lý dự án. Nhận biết được các kỹ năng cần có của nhà quản lý dự án.

Nhận thức và chấp hành các nguyên tắc trong quản trị dự án, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và kỹ năng cần có của nhà quản lý dự án.

1.2. Quản lý dự án

1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa quản lý dự án

Có nhiều khái niệm về quản lý dự án:

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đó định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Quản lý dự án là sự áp dụng một cách phù hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào trong quá trình đề xuất dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, theo dõi giám sát dự án và kết thúc dự án để đạt được các yêu cầu của dự án.

Qua các khái niệm trên có thể thấy, quản lý dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu. Đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định.

Lập kế hoạch: Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic, có thể biểu hiện dưới dạng các sơ đồ hệ thống hoặc theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống.

Điều phối thực hiện dự án: Đây là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý tiến độ thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập trình lịch cho từng công việc và toàn bộ dự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí tiền vốn, nhân lực và thiết bị phù hợp.

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

***Giám sát*:** Là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tách tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, kiến nghị các pha sau của dự án.

Các giai đoạn của quá trình quản lý dự án hình thành một chu trình năng động từ việc lập kế hoạch đến điều phối thực hiện và giám sát, sau đó phản hồi cho việc tái lập kế hoạch dự án.

Quản lý dự án thường bao gồm các công việc:

- Xác định các yêu cầu (của công ty hoặc của khách hàng)
- Xác định và đáp ứng các nhu cầu, các mối quan tâm, và mong đợi của các chủ thể dự án trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án
- Cân đối hài hoà giữa các yêu cầu, ràng buộc khác nhau của dự án bao gồm: Phạm vi dự án, Chất lượng, Tiến độ, Kinh phí, Nguồn lực, Rủi ro

Mỗi dự án cụ thể sẽ có những yêu cầu và ràng buộc nhất định đòi hỏi nhà quản lý dự án cần phải xác định thứ tự ưu tiên giữa các yêu cầu.

Giữa các ràng buộc có mối quan hệ với nhau, tức là một ràng buộc thay đổi có thể kéo theo một hoặc nhiều ràng buộc khác thay đổi theo. Ví dụ thời hạn hoàn thành dự án được yêu cầu rút ngắn lại thường kéo theo kinh phí thực hiện dự án phải tăng lên bởi vì cần phải bổ xung thêm nguồn lực để thực hiện cùng khối lượng công việc trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu không thể bổ sung thờm kinh phí cho dự án thì hoặc là phải chấp nhận thu hẹp phạm vi dự án bằng cách cắt giảm một số hạng mục công việc hoặc chấp nhận giảm chất lượng đầu ra (sử dụng nguyên vật liệu có chất lượng thấp hơn hoặc thay đổi phương án thi công đòi hỏi chi phí ít hơn và chất lượng thấp hơn). Các chủ thể dự án cũng có các ý kiến khác nhau về nhân tố nào là quan trọng nhất cho nên cũng tạo ra sự thách thức lớn cho dự án. Thay đổi các yêu cầu đối với dự án cũng có thể làm gia tăng mức độ rủi ro đối với dự án. Như vậy đội dự án phải có khả năng đánh giá được tình hình và có thể hài hoà được các yêu cầu khác nhau để thực hiện và chuyển giao dự án một cách thành công.

Mục tiêu cơ bản của các dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

giữ cho phạm vi dự án không thay đổi. Về mặt toán học, bốn vấn đề này liên quan với nhau theo công thức sau:

$$C = f(P, T, S).$$

Trong đó:

C: Chi phí.

P: Hoàn thành công việc (kết quả)

T: Yếu tố thời gian.

S: Phạm vi dự án.

Phương trình cho thấy, chi phí là một hàm của các yếu tố: hoàn thành công việc, thời gian và phạm vi dự án. Nói chung chi phí của dự án tăng lên nếu chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm và phạm vi dự án được mở rộng.

Ba yếu tố cơ bản: Thời gian, chi phí và hoàn thiện công việc là những mục tiêu cơ bản của quản lý dự án và giữa chúng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Không đơn thuần chỉ là hoàn thành kết quả mà thời gian cũng như chi phí để đạt kết quả đó đều là những yếu tố rất quan trọng. Tuy mối quan hệ giữa 3 mục tiêu của các dự án khác nhau, giữa các thời kỳ đối với cùng một dự án, nhưng nói chung đạt được kết quả tốt đối với mục tiêu này phải "hi sinh" một hoặc hai mục tiêu kia. Do vậy, trong quá trình quản lý dự án các nhà quản lý hi vọng đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa các mục tiêu quản lý dự án.

Mặc dù phương pháp quản lý dự án đòi hỏi sự nỗ lực, tính tập thể và yêu cầu hợp tác nhưng tác dụng của nó rất lớn. Phương pháp quản lý dự án có những tác dụng chủ yếu sau đây:

- Liên kết tất cả các hoạt động, công việc của dự án.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án với khách hàng và nhà cung cấp đầu vào cho dự án.
- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án.
- Tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi hoặc điều kiện không dự đoán được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan để giải quyết những bất đồng.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

- Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn

1.2.2. Nội dung quản lý dự án

Theo phạm vi: Quản lý vĩ mô và vi mô đối với dự án.

Quản lý vĩ mô hay quản lý nhà nước đối với dự án bao gồm tổng thể các biện pháp vĩ mô tác động đến các yếu tố của quá trình hình thành, hoạt động và kết thúc dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhà nước mà đại diện là các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế luôn theo dõi chặt chẽ, định hướng và chi phối hoạt động của dự án nhằm đảm bảo cho dự án đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội. Những công cụ quản lý vĩ mô chính của nhà nước để quản lý dự án bao gồm các chính sách, kế hoạch, quy hoạch như chính sách về tài chính tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, chính sách đầu tư, chính sách thuế, hệ thống luật pháp, những quy định về chế độ kế toán, thống kê, bảo hiểm, tiền lương...

Quản lý dự án ở tầm vi mô là quá trình quản lý các hoạt động cụ thể của dự án. Nó bao gồm nhiều khâu công việc như lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát... các hoạt động dự án. Quản lý dự án bao gồm hàng loạt vấn đề như: Quản lý thời gian, chi phí, nguồn vốn đầu tư, rủi ro, quản lý hoạt động mua bán... Quá trình quản lý được thực hiện trong suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến giai đoạn vận hành kết quả của dự án.Trong từng giai đoạn, tuy đối tượng quản lý cụ thể có khác nhau nhưng đều phải gắn với 3 mục tiêu cơ bản của hoạt động quản lý dự án là: thời gian, chi phí và kết quả hoàn thành.

Theo đối tượng quản lý, quản lý dự án gồm 9 lĩnh vực chính cần được xem xét, nghiên cứu:

Lập kế hoạch tổng quan: Lập kế hoạch tổng quan cho dự án là quá trình tổ chức dự án theo một trình tự logic, xác định những công việc cần làm, nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án. Kế hoạch dự án là việc chi tiết hoá các mục tiêu dự án thành những công việc cụ thể và hoạch định một chương trình để thực hiện các công việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản lý khác nhau của dự án đã được kết hợp một cách chính xác và đầy đủ. Kế hoạch dự án bao gồm nhiều loại kế hoạch như: kế hoạch tổng thể về dự án, kế hoạch tiến độ, kế hoạch ngân sách, kế hoạch phân phối nguồn lực...

Quản lý phạm vi: Quản lý phạm vi là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích,

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

mục tiêu của dự án, xác định công việc nào thuộc về dự án và cần phải thực hiện, công việc nào ngoài phạm vi của dự án.

Quản lý thời gian: Quản lý thời gian là việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thời gian nhằm đảm bảo thời hạn hoàn thành dự án. Nó chỉ rõ mỗi công việc kéo dài bao lâu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc và toàn bộ dự án bao giờ sẽ hoàn thành.

Quản lý chi phí: Quản lý chi phí của dự án là quá trình dự toán kinh phí, giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ cho từng công việc và toàn bộ dự án; là việc tổ chức, phân tích số liệu và báo cáo những thông tin về chi phí.

Quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư.

Quản lý nhân lực: Quản lý nhân lực là việc hướng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy việc sử dụng lực lượng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào?

Quản lý thông tin: Quản lý thông tin là đảm bảo quá trình thông tin thông suốt một cách nhanh nhất và chính xác giữa các thành viên dự án và với các cấp quản lý khác nhau. Thông qua quản lý thông tin có thể trả lời được các câu hỏi: Ai cần thông tin về dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản lý dự án cần báo cáo cho họ bằng cách nào?

Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là xác định các yếu tố rủi ro của dự án, lượng hoá mức độ rủi ro và có kế hoạch đối phó cũng như quản lý từng loại rủi ro.

Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán: Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán của dự án là quá trình lựa chọn, thương lượng, quản lý các hợp đồng và điều hành việc mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ,... cần thiết cho dự án. Quá trình quản lý này giải quyết vấn đề: bằng cách nào dự án nhận được hàng hoá và dịch vụ cần thiết của các tổ chức bên ngoài cung cấp cho dự án, tiến độ cung, chất lượng cung như thế nào?

Quản lý theo chu kỳ của dự án.

Dự án là một thực thể thống nhất, thời gian thực hiện dài và có độ bất định nhất định nên các tổ chức, đơn vị thường chia dự án thành một số giai đoạn để quản lý thực hiện. Mỗi giai đoạn được đánh dấu bởi việc thực hiện một hoặc nhiều công việc. Tổng hợp các giai

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

đoạn này được gọi là chu kỳ dự án. Chu kỳ dự án xác định điểm bắt đầu, điểm kết thúc và thời hạn thực hiện dự án. Chu kỳ dự án xác định những công việc nào sẽ được thực hiện trong từng pha và ai sẽ tham gia thực hiện. Nó cũng chỉ ra những công việc còn lại nào ở giai đoạn cuối sẽ thuộc và không thuộc phạm vi dự án. Thông qua chu kỳ dự án có thể nhận thấy một số đặc điểm: Thứ nhất, mức chi phí và yêu cầu nhân lực thường là thấp khi bắt đầu dự án, tăng cao hơn vào thời kỳ phát triển, nhưng giảm nhanh chóng khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc. Thứ hai, xác suất hoàn thành dự án thành công thấp nhất và do đó rủi ro là cao nhất khi bắt đầu thực hiện dự án. Xác suất thành công sẽ cao hơn khi dự án bước qua các pha sau. Thứ ba, khả năng ảnh hưởng của chủ đầu tư tới đặc tính cuối cùng của sản phẩm dự án và do đó tới chi phí là cao nhất vào thời kỳ bắt đầu và giảm mạnh khi dự án được tiếp tục trong các pha sau

Chu kỳ dự án có thể chia làm nhiều giai đoạn khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu. Với dự án sản xuất công nghiệp, thông thường chu kỳ dự án được chia thành 4 giai đoạn: Xây dựng ý tưởng, giai đoạn phát triển, giai đoạn triển khai, giai đoạn kết thúc.

Xây dựng ý tưởng: Là việc xác định bức tranh toàn cảnh về mục tiêu kết quả cuối cùng và phương pháp thực hiện kết quả đó. Xây dựng ý tưởng dự án được bắt đầu ngay từ khi dự án bắt đầu hình thành. Tập hợp số liệu xác định nhu cầu, đánh giá độ rủi ro, dự tính nguồn lực, so sánh lựa chọn dự án ba. Là những công việc được triển khai và cần được quản lý trong giai đoạn này. Quyết định chọn lựa dự án là những quyết định chiến lược dựa trên mục đích, nhu cầu và các mục tiêu lâu dài của tổ chức, doanh nghiệp. Trong giai đoạn này những nội dung được phép đến là mục đích yêu cầu của dự án, tính khả thi, lợi nhuận tiềm năng, mức độ chi phí, độ tuổi do và ước tính nguồn lực cần thiết. Đồng thời cũng cần làm rõ hơn nữa ý tưởng dự án bằng cách phác thảo Những kết quả và phương pháp thực hiện trong điều kiện hạn chế về nguồn lực. Phát triển ý tưởng dự án không cần thiết phải lượng hóa hết bằng các chỉ tiêu nhưng nó phải ngắn gọn và được diễn đạt trên cơ sở thực tế.

Giai đoạn phát triển: là giai đoạn chi tiết xem dự án cần được thực hiện như thế nào mà nội dung chủ yếu của nó tập trung vào công tác thiết kế và lập kế hoạch. Đây là giai đoạn chứa đựng những công việc phức tạp nhất của một dự án. Nội dung của dự án này bao gồm các công việc như thành lập nhóm dự án, lập kế hoạch tổng quan, phân tích công việc, lập kế

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

hoạch tiến độ thời gian, lập kế hoạch ngân sách, thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất, lập kế hoạch nguồn lực cần thiết, lập kế hoạch chi phí và dự báo dòng tiền thu, xin phê chuẩn thực hiện. Kết thúc giai đoạn này tiến trình thực hiện dự án có thể được bắt đầu. Thành công của dự án phụ thuộc khá lớn vào chất lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các kế hoạch trong giai đoạn này.

Giai đoạn triển khai: là giai đoạn quản lý dự án bao gồm các công việc cần thực hiện như việc xây dựng nhà xưởng và công trình, lựa chọn công cụ, mua sắm thiết bị và lắp đặt. Đây là giai đoạn chiếm nhiều thời gian và nỗ lực nhất những vấn đề cần xem xét trong giai đoạn này là những yêu cầu kỹ thuật cụ thể, vấn đề so sánh đánh giá lựa chọn công cụ thiết bị, kĩ thuật lắp ráp, mua thiết bị chính. Kết thúc giai đoạn này các hệ thống được xây dựng và kiểm định dây chuyền sản xuất được vận hành

Giai đoạn kết thúc: Trong giai đoạn kết thúc của chu kỳ dự án cần thực hiện những công việc còn lại như hoàn thành bàn giao công trình và những và những liên quan đánh giá phương án giải phóng nguồn lực.

1.2.3. Các mô hình quản lý dự án

Mỗi dự án có những đặc trưng riêng biệt, được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, có sự liên quan đến nhiều bên khác nhau. Việc lựa chọn mô hình quản lý phù hợp sẽ giúp chủ đầu tư nhanh chóng và dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn mô hình quản lý dự án như: Tính chất của dự án (xác định rõ công trình, là dự án hoàn toàn mới hay sửa chữa, mở rộng), quan hệ vốn chủ sở hữu (dự án sử dụng vốn Nhà nước hay là vốn tư nhân)

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án:

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Chủ đầu tư

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

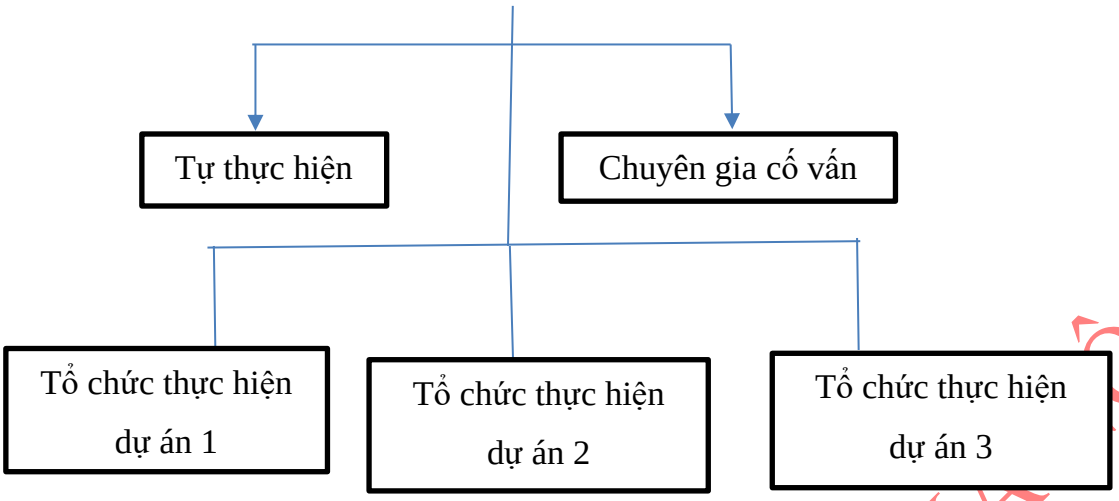

Hình 1.1: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Đây là mô hình chủ đầu tư là người có kinh nghiệm và am hiểu về kỹ thuật thực hiện dự án. Chủ đầu tư có thể tự thực hiện dự án hoặc thuê ban cố vấn để tiến hành các hoạt động. Mọi quyết định của ban cố vấn phải thông qua chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến dự án. Có thể dễ dàng thấy mô hình này trong trường hợp một chủ cai thầu xây dựng đầu tư xây dựng nhà cho gia đình mình. Một kỹ sư công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển và mở công ty phát triển phần mềm tin học cho học sinh.

Ưu điểm: Chủ đầu tư là người am hiểu về chuyên môn, kỹ thuật của dự án nên có thể quản lý dự án chặt chẽ, tránh thất thoát lãng phí chi phí trong quá trình thực hiện dự án

Nhược điểm: Mô hình này chủ phù hợp với các dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn của chủ đầu tư.

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án:

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

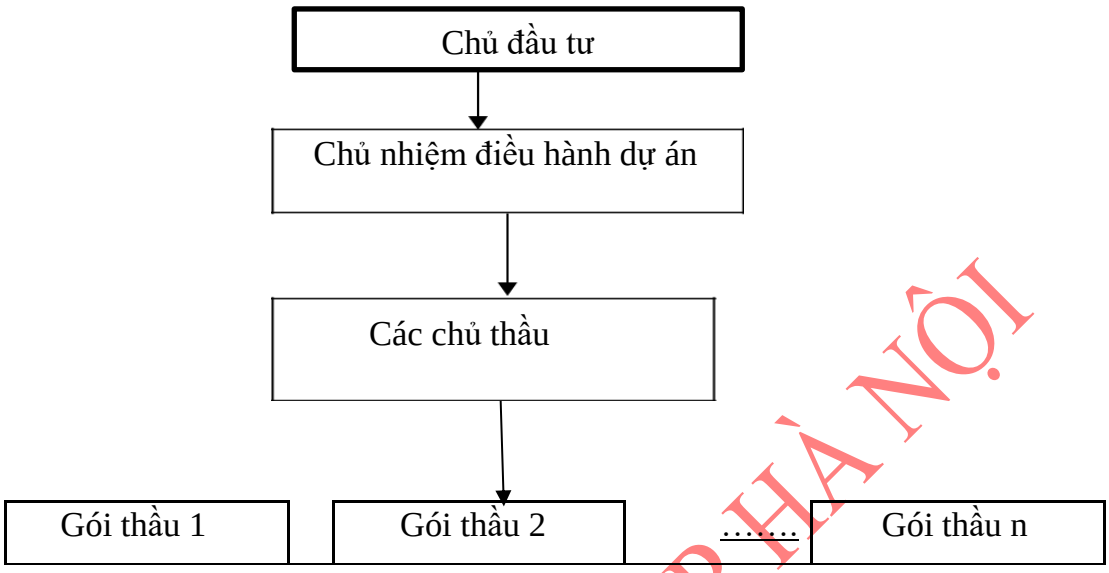

Hình 1.2: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư giao cho ban quản lý chuyên ngành là chủ nhiệm điều hành dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là cá nhân, tổ chức có năng lực chuyên môn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để điều hành, quản lý dự án. Chủ đầu tư là người bỏ vốn, chủ thầu chịu trách nhiệm phụ trách toàn bộ vấn đề kỹ thuật liên quan đến dự án. Ví dụ chủ đầu tư thuê chủ thầu tiến hành xây dựng thực hiện dự án tổ hợp căn hộ cho thuê.

Ưu điểm: Chuyên môn hóa trong việc thực hiện dự án, phù hợp với các dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp.

Nhược điểm: Có thể dễ lãng phí chi phí nếu chủ đầu tư không quản lý

Mô hình chìa khóa trao tay: Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, từ khảo sát, thiết kế đến tổ chức thực hiện và bàn giao sản phẩm. Tổng thầu có thể thuê thêm nhà thầu phụ. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, khi áp dụng hình thức chìa khoá trao tay chỉ thực hiện đối với các dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.



Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

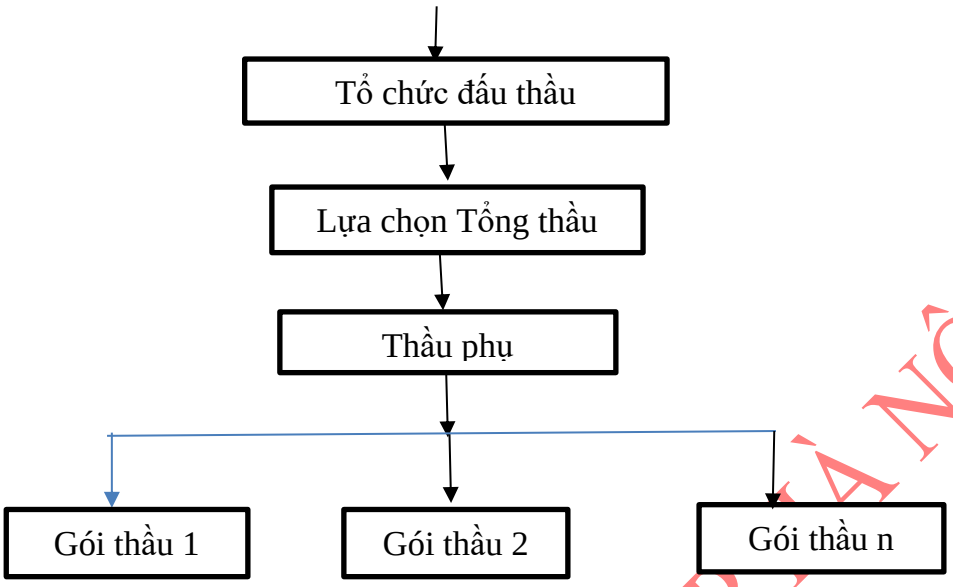

Hình 1.3: Mô hình chìa khóa trao tay

Các trường hợp phù hợp để áp dụng mô hình tổ chức dự án dạng này: Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, dự án sử dụng ngân sách của tập đoàn hoặc tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp có đủ năng lực để cải tạo và sửa chữa các dự án quy mô nhỏ, các dự án liên quan đến cộng đồng.

Ưu điểm: Chuyên môn hóa cao, phù hợp với cả các dự án quy mô lớn. Chủ thầu chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật liên quan đến dự án nên tập trung quản lý

Nhược điểm: Các doanh nghiệp tư nhân áp dụng hình thức này cần có quy mô lớn, đủ năng lực thực hiện

Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng:

Dự án đầu tư được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (tuỳ thuộc vào tính chất của dự án). Các thành viên quản lý dự án được điều động tạm thời từ các phòng chức năng khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần việc chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

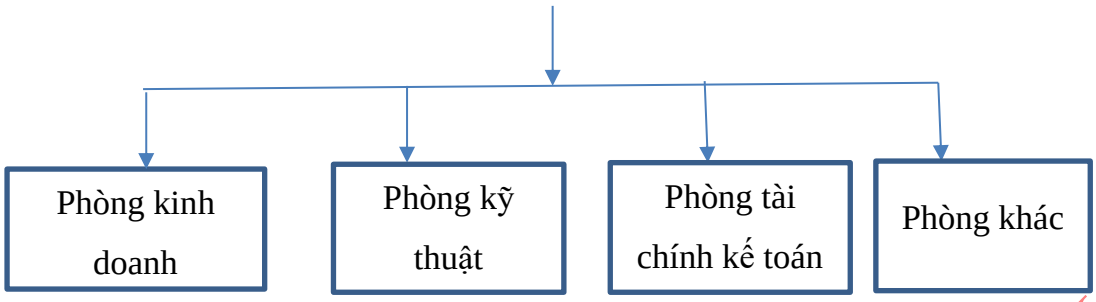

Hình 1.4: Mô hình quản lý dự án theo chức năng

Mô hình quản lý này có ưu điểm sau:

Linh hoạt trong việc sử dụng cán bộ. Phòng chức năng có dự án đặt vào chỉ quản lý hành chính và tạm thời một số mặt đối với các chuyên viên tham gia quản lý dự án đầu tư. Họ sẽ trở về vị trí cũ của mình tại các phòng chuyên môn khi kết thúc dự án.

Một người có thể tham gia vào nhiều dự án để sử dụng tối đa, hiệu quả vốn, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên viên.

Mô hình này có nhược điểm: Đây là cách tổ chức quản lý không theo yêu cầu của khách hàng. Vì dự án được đặt dưới sự quản lý của một phòng chức năng nên phòng này thường có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính của nó mà không tập trung nhiều nỗ lực vào việc giải quyết thoả đáng các vấn đề của dự án. Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với các phòng chức năng khác cùng thực hiện dự án. Do đó dự án không nhận được sự ưu tiên cần thiết, không đủ nguồn lực để hoạt động hoặc bị coi nhẹ.

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án: Đây là mô hình quản lý mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

Mô hình quản lý này có ưu điểm:

Đây là hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu của khách hàng nên có thể phản ứng nhanh trước yêu cầu của thị trường. Nhà quản lý dự án có đầy đủ quyền lực hơn đối với dự án. Các thành viên trong ban quản lý dự án chịu sự điều hành trực tiếp của chủ nhiệm dự án, chứ không phải những người đứng đầu các bộ phận chức năng điều hành. Do sự tách khỏi các phòng chức năng nên đường thông tin được rút ngắn, hiệu quả thông tin sẽ cao hơn.

Giám đốc

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

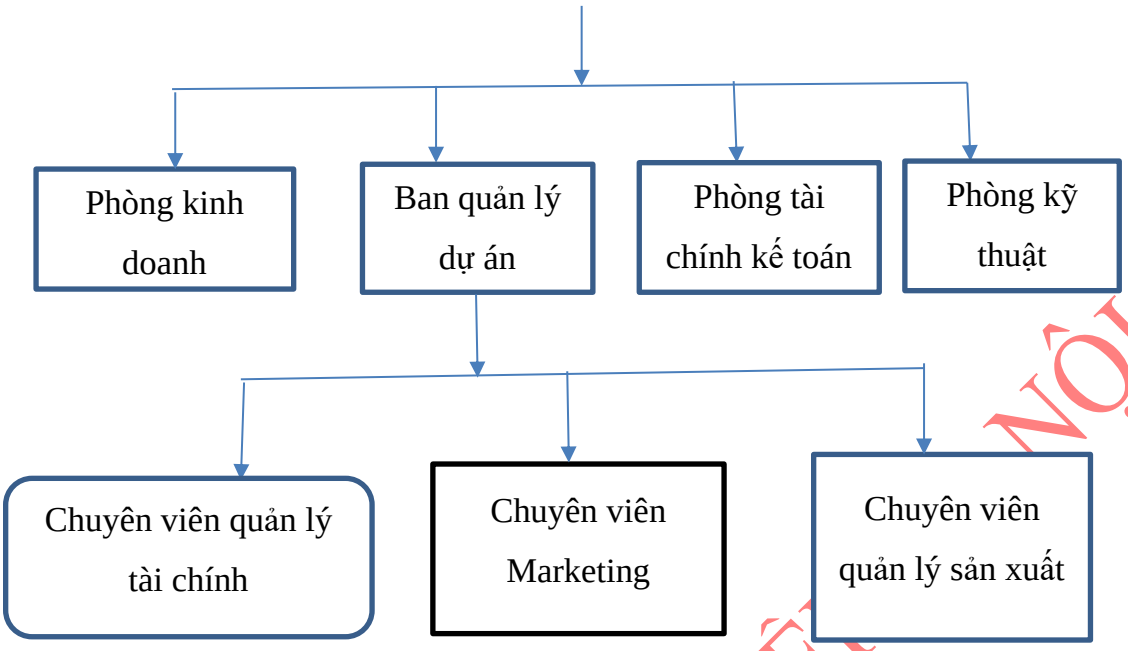

Hình 1.5: Mô hình quản chuyên trách quản lý dự án

Tuy nhiên mô hình này cũng có những nhược điểm sau:

Khi thực hiện đồng thời nhiều dự án ở những địa bàn khác nhau và phải đảm bảo đủ số lượng cán bộ cần thiết cho từng dự án thì có thể dẫn đến tình trạng lãng phí nhân lực.

Do yêu cầu phải hoàn thành tốt mục tiêu về thời gian, chi phí của dự án nên các ban quản lý dự án có xu hướng tuyển hoặc thuê các chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực vì nhu cầu dự phòng hơn là do nhu cầu thực cho hoạt động quản lý dự án.

Mô hình quản lý dự án dạng ma trận

Mô hình quản lý dạng ma trận được Hình thành trên cơ sở kết hợp hai tuyến quyền lực (hay phân quyền) trong doanh nghiệp: (1) theo chiều dọc từ các nhà quản trị theo chức năng và (2) theo chiều ngang từ các nhà quản trị theo chương trình, dự án…

Cơ cấu ma trận thường được sử dụng trong các doanh nghiệp có các dự án lớn, hoạt động tương đối độc lập như trong các ngành xây dựng, máy bay hoặc phần mềm máy tính…; khi doanh nghiệp phải đối mặt với những tình huống cần kết hợp chuyên môn của nhiều bộ phận chức năng khác nhau cùng triển khai thực hiện.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

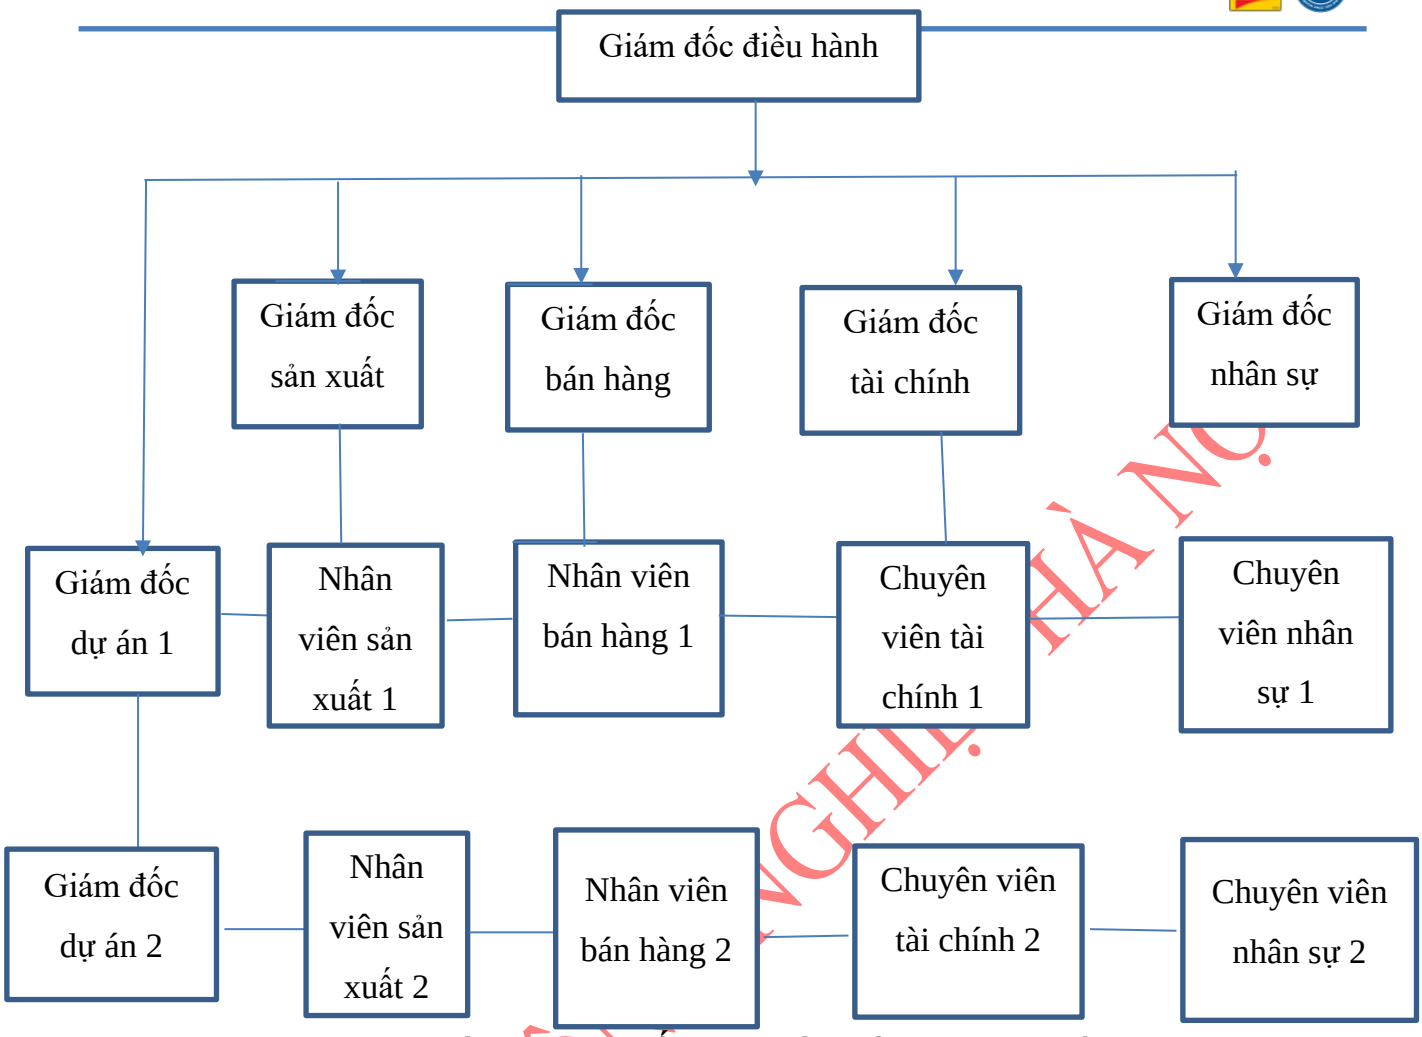

Hình 1.6: Cơ cấu quản lý dự án dạng ma trận

Ưu điểm: Hình thành trên cơ sở kết hợp hai tuyến quyền lực (hay phân quyền) trong doanh nghiệp: (1) theo chiều dọc từ các nhà quản trị theo chức năng và (2) theo chiều ngang từ các nhà quản trị theo chương trình, dự án…

Cơ cấu ma trận thường được sử dụng trong các doanh nghiệp có các dự án lớn, hoạt động tương đối độc lập như trong các ngành xây dựng, máy bay hoặc phần mềm máy tính…; khi doanh nghiệp phải đối mặt với những tình huống cần kết hợp chuyên môn của nhiều bộ phận chức năng khác nhau cùng triển khai thực hiện

Nhược điểm: Các tổ chức ma trận rất khó kiểm soát: thường mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định do những thương lượng của các nhà quản lý của các bộ phận khác nhau; hoặc có xung đột về lệnh chồng chéo xảy ra do nhân viên chịu sự quản lý trực tiếp của nhiều bộ phận khác nhau;

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

Chi phí quản trị lớn vì cấu trúc ma trận cần số lượng lớn các nhà quản trị để phối hợp các phòng ban chức năng, dự án… khác nhau trong doanh nghiệp.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved
